



"СММ" ХХК
 Монгол улс, Улаанбаатар хот
 Утас: 976-9910-0812, Факс: 976-7018-0812
 И-мэйл: cmm_llc@yahoo.com

2021-11-19 № 01/244

тантай _____-ны № _____-т

Санхүүжилт хүсэх тухай

Манай компаний тантай компанитай 56/21 тоот "Зуух №6-н их засварын ажил" гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд их засварын ажлын гүйцэтгэл 80%-д хүрсэн тул гэрээний 60% санхүүжилт болох 616 973 344/Зургаан зуун арван зургаан сая есөн зуун далан гурван мянга гурван зуун дөчин дөрвөн/ төгрөгийг манай компаний Хаан банкны 5009472548 тоот дансанд шилжүүлж өгч бидний ажилд гүн туслалцаа үзүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн
 Захирал



Б.Болдбаатар

СӨХ-15

Улаанбаатар

2021

XI/19.

Зуух №6-н их засварын ажлын 80% -ийн гүйцэтгэлийн тайлан

2021.11.16 ний өдөр

"Зуух №6-н халах өрлөгийн их засварын ажлыг" СММ ХХК 2021.06.14 оос 8-р сарын 26 хүртэл хугацаанд материалтай нь 1,028,288,908 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэхээр 56/21 тоот гэрээ байгуулан ажилласан.

Их засварт шаардлагатай БНХАУ-аас нийлүүлэх ган труба, өрлөг дулаалгын материалууд Эрээн Замын-Үүдийн хоорондох тээвэр, хил гаальдээр цар тахлын хорио цээрийн дэглэмээс шалтгаалан хүлээгдэж байсан тул, энэ талаар МУ-н худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас давагдашгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээ гаргаж өгсөн.

Захиалагчийн зүгээс 9-р сарын 8 нд ЭХЯ-д хандан засварын материалыг хилээр оруулж өгөхөд дэмжлэг үзүүлэх тухай албан бичиг явуулж, гэрээг 9-р сарын 30 хүртэл сунгаж өгсөн.

2021 оны 9-р сарын 28-аас Ф60, Ф38, Ф32мм –ийн труба, өрлөг дулаалгын материалууд ирж угсралтын ажлууд үргэлжлэн явагдаж эхэлсэн. 2021 оны 11-р сарын 16-ний өдрийн байдлаар 5

- Экран хоолойн угсралт 98%
- Уур халаагчийн угсралт 100%
- Экономайзерийн угсралт 100%
- Буух хоолойн угсралт 100%
- Доод, дээд коллекторын тагууд тавигдаагүй байна.

СММ ХХК –ийн 22 ажилтан ажиллаж байна. Материал нийлүүлэлт 80 хийгдсэн.

Өрдөг дулаалгийн материалууд дутуу, дотоодын зах зээлээс нийлүүлэлт йхихээр хөөцөлдөж байна. 11-р сарын 17-нд усан шахалт хийнэ. 11-р сарын 30 нд их засварын ажлыг дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Гүйцэтгэгчийн зүгээс 10-р сарны 21 ний өдөр 01/229 тоот албан бичгээр хандан гэрээг 11-р сарын 30 хүртэл сунгаж өгөх хүсэлт тавьсан байгаа.

Ажлын гүйцэтгэл 80%-тай байна. Их засварын фото зургуудыг хавсаргав.

Тайланг хянасан: "ДДЦС" ТӨХК-ний

Дэд захирал бөгөөд ерөнхий инж

Б.Хаш-Эрдэнэ

Инженерийн албаны дарга - 2

Д.Жагварал

Зуухан цехийн дарга

Б.Батжаргал



Техник хяналтын инженер

Н.Эрдэнэбат

Их засварын ажлын явцын тайлан гаргасан:

"СММ" ХХК-ийн засварын инженер

М.Амгалан

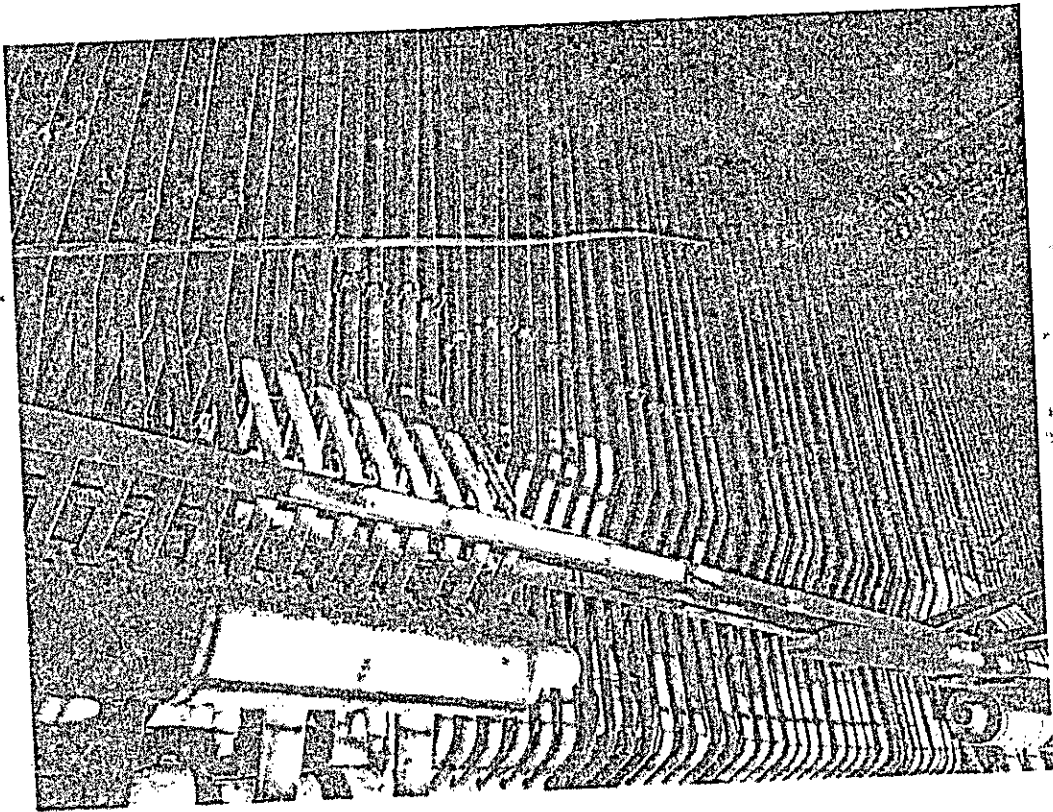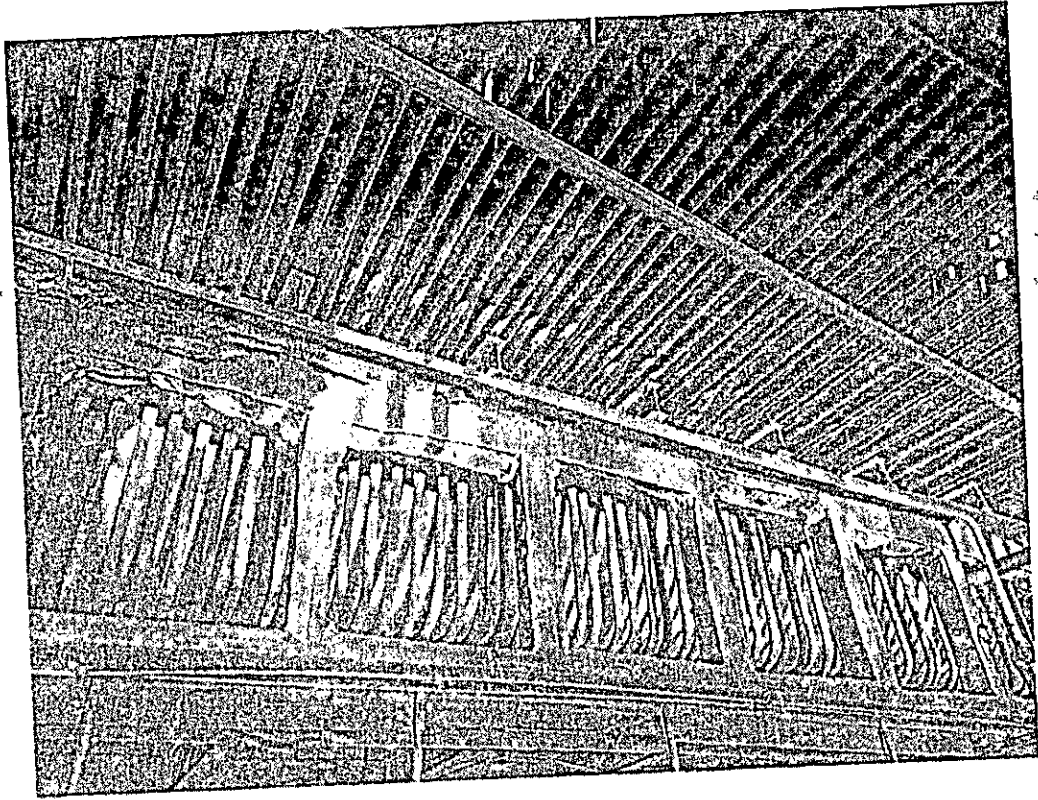

М.Жаргалсайхан



БАТЛАВ. "Дархан ДЦС" ТӨХК - ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Зуух №6-ын их засварын явцын дундах /80%/ гүйцэтгэл №1

ДҮН: 821,166,193 төгрөг

ХЯНАСАН : "ДДЦС ТӨХК"-ний

Дэд захирал бөгөөд Ерөнхий инженер

Инженерийн албаны дарга

СБХ-ийн дарга

ХҮХ-ийн дарга

Зуухан цехийн дарга

ИА-ны Техник хяналтын инженер

ГҮЙЦЭТГЭЛ ГАРГАСАН:

"СММ" ХХК-ний Захирал

"СММ" ХХК-ны Үйлдвэрлэлийн менежер –Г

Б.Хаш-Эрдэнэ

Д.Жагварал

Ц.Ууганбаяр


Э.Алтантулга

Б.Батжаргал

Н.Эрдэнэбат

Б.Болдбаатар

М.Энхтайван



Дархан -Уул аймаг. 2021 он

10.010

Зуух №6 их засварын ажлын явцын дундах /80%/гүйцэтгэлийн төсөв №1

№	Үндэслэл	зэрэг	Хийгдэх ажлууд	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Хүн/цаг	Цагийн тариф	Гүйцэтгэл хувь	дүн
1	Тарифаар		Ажлын байрыг хүлээн авч засварын хэрэгслэлийг байрлуулах, засварын дараа хураан авах	ком	1		3117.71	0%	-
2	05041202	3.6	Засварын дараа агаараар шахаж гэмтэл тодруулах, арилгах	удаа	1	40	3117.71	0%	-
3	05041201	3.6	Усан шахалт засварын дараа хийж гэмтэл арилгах	удаа	1	25.6	3117.71	50%	39,907
4	32400101	3.6	Зууны их бие, галын хотолд шат тавцан барих, буулгах	м2	80	1.8	3117.71	100%	448,950
			Халгах гадаргуугийн засварын ажил						
1	03010101	3.6	Бараван нээж доторхи төхөөрөмжийн задлан гаргаж, цэвэрлэгээ, засварыг бүрэн хийж	ком	1	615	3117.71	100%	1,917,392
2	03020204	3.6	Бараванаас гарсан ф25, 32, 60-ын шүдэрүүд бүрэн солих	ш	20	6	3117.71	100%	374,125
3	05020102	3.6	Зуух гэжээгч ф60х4 мм труба хоолойг экономайзераас, бараван хүртэл шүдэртэй шинээр солих 10ш	тн	0.662	226	3117.71	100%	466,447
4	03020204	3.6	Уур халаагчийн хамгаалах клапануудын шүдэрүүдийг шинээр солих	ш	3	6	3117.71	100%	56,119
5	05020102	3.6	Аваарын сливын шугам хоолойг анхдагч хаалт хүртэл солих 60х4 15м	тн	0.083	226	3117.71	100%	58,482
6	05020102	3.6	Проводуэжын шугам хоолойг анхдагч хаалт хүртэл солих 6м	тн	0.033	226	3117.71	100%	23,252
7	08020101	3.6	Гарна циклоны дренажын шугам хоолойг анхдагч хаалт хүртэл солих 32х4 30м	тн	0.083	286	3117.71	100%	74,008
8	05020101	3.6	Үргэлжийн үе үеийн үлээлгийн шугамуудыг анхдагч хаалт хүртэл шинээр солих / ф32*3.5 мм труба хоолойг 18м	тн	0.044	286	3117.71	100%	39,233
9	05020102	3.6	Бараваны рециркуляцийн шугам шинээр солих / ф60*3.5 мм труба хоолой / 18м	тн	0.087	226	3117.71	100%	61,300
10	02010102	3.6	Уур хөргөгч, уур халаагч, засварын коллекторуудад металлын үзлэн хийж ба гулайлтын хэмжээг тодорхойлж, шаардлага хангахгүй коллектторыг шинээр солих	ш	5	25.8	3117.71	100%	402,185
11	08030103	3.6	Уур халаагчийн таазны металл каркасанд үзлэг хийж, зөрвэрт, гузайлтын хэмжээг тодорхойлж, шаардлага хангахгүй багуудыг шинээр солих	тн	1	149	3117.71	85%	394,858
12			Уур халаагчийн 1,2-р үеийг бариванаас коллекторууд хүртэл бүрэн буулгаж, демонтаж хийж зайлуулах, ф108*4 мм солигсон 10-н хоолойн хамт	тн	17	228	3117.71	100%	12,084,244
13	01020301	3.6	Уур халаагчийн 1,2-р үеийн эмбеекүүдийг зураг схемүүдийн дагуу матаж бэлтгэн боловсруулалт хийн гатнаж угсрах, ф108*4 мм солигсон 10-н хоолойн хамт	тн	17	228	3117.71	100%	12,084,244


35	11010103	3.6	Горелка задалж, агаар тоосны шугамууд, горелькуудын амбраур шинэчлэн солих	Ш	3	113	3117.71	80%	845,523
36	01030101	3.6	Эжрат хоолойнуудын элэгдэж, шатсан бэхэлгээ бүснүүдийг шинээр татах	Ш	550	0.8	3117.71	80%	1,097,434
37	07020101	3.6	Галын хотлын сүүлийн хэсгийн элэгдэж муудсан обшивкуудыг шинээр солих / ган лист б=3мм/ 80м ²	ТН	1.92	151	3117.71	90%	813,498
38	07020101	3.6	ДВ-ын сорох, шахах талын хоолойн металл хэсгийн элэгдэж нимгэрсэн хэсгийг солих ган лист б=4 мм 18м ² .	ТН	0.576	151	3117.71	100%	271,166
39	ХА1140101	3.6	Галын хотол, уур халаагчийн тэсрэлтийн клапанг завсарлах	Ш	4	57.5	3117.71	70%	501,951
40	04010102	3.6	Уур хөргөлгийн зүрхэвчид усан шахалт хийж, шаардлагатай бол шинээр хийж солих	Ш	2	232	3117.71	100%	1,446,617
41	08010102	3.6	Хүйтэн бронжны элэгдсэн каракас, обшивка шинээр солих /ган лист б=4мм/ 24м ²	ТН	0.768	162	3117.71	90%	349,104
42	08030103	3.6	Тэмдэгт 5-ын шалыг шинээр солих Сеткан лист б=4мм 20м ²	ТН	0.64	149	3117.71	50%	148,652
43	08030103	3.6	Зуухны каракас, шгт хэшилгүүдийг сэргээн засварлах, шаардлагатай хэсгийг солих	ТН	1	149	3117.71	50%	232,269
44	05020103	3.6	Гадаад циклоноос барабанд холбогдсон Ф108х4мм хоолойг шинээр солих 20м	ТН	0.2	211	3117.71	100%	131,567
1	ДТ1030501	3.5	Өрлөг дулаан тусгаарлалтын ажиг	М3	1.2	53	3074.29	60%	117,315
2	ДТ2050101	3.5	Барабаны тулах өрлөгийг буулгаж, шинээр өрөх	М2	6	58	3074.29	50%	534,926
3	ДТ1030501	3.5	Халуун яшикны таазны өрлөг бетон буулгаж шинээр хийх	М3	120	53	3074.29	100%	19,552,484
4			Галын хотлын 4-н хананы өрлөг таавир, татуургын хамт шинэчлэн өрлөг хийх	М2	20	1.4	3074.29	50%	43,040
5	ДТ1090201	3.5	Барабаны гадна талын дулаалга бүрэн хийх	М3	18	53	3074.29	100%	2,932,873
6	ДТ1030501	3.5	Уур халаагчийн таазны өрлөг бетон, дулаалга бүрэн буулгаж	М3	3	53	3074.29	50%	244,406
7	ДТ1030501	3.5	Уур халаагчийн 1-р үеийн урд налуугийн өрлөгийг шинээр хийх	М3	1.5	53	3074.29	100%	244,406
8	ДТ1030501	3.5	Уур халаагчийн доод талын боссогийн өрлөгийг шинээр хийх	М3	6	53	3074.29	100%	977,624
9	ДТ1030501	3.5	Уур халаагчийн 2-р үеийн ар, 2 хажуугийн өрлөг бетоныг буулгаж, шинээр өрөх	М3	18	53	3074.29	65%	1,906,367
10	ДТ1030501	3.5	Уур халаагчийн таазны өрлөг бүрэн хийж / ус тогтохгүй болон	М3	8	53	3074.29	90%	1,173,149
11	ДТ1030501	3.5	Сүүлийн хэсгийн өрлөг дулаалга бүрэн хийх	М3	3	53	3074.29	50%	244,406
12	ДТ1030501	3.5	Засварын коллектор, ба бусад коллекторын өрлөг дулаалга шинээр хийх	М3	3	53	3074.29	50%	244,406

Зуух №6 их засварын ажлын явцын дундах материал тээврийн гүйцэтгэл №1

№	Материалын нэр	Тип-марк	Хэмжээ их нэрж	Нийлүүлэх тоо хэмжээ	Нийлүүлсэн тоо хэмжээ	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд үнэ	Тээврийн зардал /төгрөг/			нийт дүн	Тайлбар
								Нэрж жин /тн/	Зай /км/	Тн-км-хөлс		
1	Ган труба ф108х6 Ст20	Ст20	тн	3	3	3,800,000	11,400,000	1,000	900	213.35	576,045	Бух хоолой
2	Ган труба ф83х6 Ст20	Ст20	тн	10	10	3,800,000	38,000,000	1,000	900	213.35	1,920,150	Бух хоолой, уур хөргөгчийн цутгам
3	Ган труба ф60х4 Ст20	Ст20	тн	28	28	3,800,000	106,400,000	1,000	900	213.35	5,376,420	Экран, 9м урттай
4	Ган труба ф32х4 Ст20 L-9м	Ст20	тн	24	24	3,800,000	91,200,000	1,000	900	213.35	4,608,360	Экономизер 1.2-р үеийн бүрэн солих, 9м урттай
5	Ган труба ф38х3.5 Ст20	Ст20	тн	17	17	3,800,000	64,600,000	1,000	900	213.35	3,264,255	Уур халаалгч 1.2-р үе бүрэн солих
6	Ган труба ф25х3 Ст20	Ст20	тн	0.5	0.5	3,800,000	1,900,000	1,000	900	213.35	96,008	Зүрхэвч үзлэг засвар
7	Ган лист б=8мм	Ст3-5	тн	1	0.576	2,500,000	1,440,000	1,000	900	213.35	110,601	Үнс баригч хөмсөг, чих
8	Ган лист б=4мм	Ст3-5	тн	5	3,744	2,500,000	9,360,000	1,000	900	213.35	718,904	00 бүнкер, сүүлийн хэсэг
9	Ган лист б=3мм	Ст3-5	тн	2.5	0.648	2,500,000	1,620,000	1,000	900	213.35	124,426	Обшивка
10	Сетка лист б=4	Ст3-5	тн	3	3	2,500,000	7,500,000	1,000	900	213.35	576,045	тэмдэгт №5-ын тавцан
11	Ган лист б=2мм	Ст3-5	тн	1	0.7	2,500,000	1,750,000	1,000	900	213.35	134,411	Компенсатор
12	Нерж лист б=4мм 45м2		тн	1.44	1.44	8,000,000	11,520,000	1,000	900	213.35	276,502	Уур халаагчийн хомууг, үнс баригч
13	Ган фрутжи ф18мм	Ст5	тн	2	2	2,500,000	5,000,000	1,000	900	213.35	384,030	Татуурга
14	Арматур ф14	Ст5	тн	2	1.3	2,500,000	3,250,000	1,000	900	213.35	249,620	таазны бетон цутгах
15	Угольник 75х75мм		м	60	60	10,000	600,000	0.006	900	213.35	69,125	каракас
16	Угольник 40х40мм		м	220	220	4,500	990,000	0.002	900	213.35	84,487	Экономизерын сам
17	Угольник 100х100мм		м	36	36	15,000	540,000	0.012	900	213.35	82,950	Каракас
18	Люк Ф550мм		ш	4		400,000		0.050	900	213.35		Сүүлийн хэсэгт
19	Швиллер№ 16		тн	2	2	2,500,000	5,000,000	1,000	900	213.35	384,030	Каракас шат тавцан
20	Швиллер№ 14		тн	1	1	2,500,000	2,500,000	1,000	900	213.35	192,015	Каракас шат тавцан
21	Швиллер№ 10		тн	1		2,500,000		1,000	900	213.35		Каракас шат тавцан
22	Двухтавр №16		тн	2	2	2,500,000	5,000,000	1,000	900	213.35	384,030	Каракас
23	Двухтавр №22		тн	1.6		2,500,000		1,000	900	213.35		Каракас
24	Двухтавр №36		тн	0.5		2,500,000		1,000	900	213.35		Каракас

55	Банз б=50мм	50мм	м3	6	6	400,000	2,400,000	0.020	900	213.35	23,042	шат тавцан засах
56	Төмөр утас 4-8мм		кг	40		2,000	-	0.001	900	213.35	-	Бэхлэгэнд
57	Цагаан будаг		кг	36		4,000	-	0.001	900	213.35	-	Их бие будах
58	Улаан будаг		кг	36		4,000	-	0.001	900	213.35	-	Их бие будах
59	Цэнхэр будаг		кг	200		4,000	-	0.001	900	213.35	-	Их бие будах
60	Ногоон будаг		кг	200		4,000	-	0.001	900	213.35	-	Их бие будах
61	Хүрэн грунт		кг	180	120	4,000	480,000	0.001	900	213.35	23,042	Их бие будах
62	будаг шингэлэгч		л	80	20	3,000	60,000	0.001	900	213.35	3,840	Их бие будах
63	Багс		ш	20	10	1,500	15,000	0.001	900	213.35	1,920	Их бие будах
64	Өнхрүүш		ш	30		2,000	-	0.001	900	213.35	-	Их бие будах
65	Стеклоткань		м	400		2,000	-	0.001	900	213.35	-	Шугам хоолойн дулаалга
66	Шингэн шил		кг	280		1,500	-	0.001	900	213.35	-	Шугам хоолойн дулаалга
67	Гэрлийн бүрхүүл, чийдэн		ш	30	30	2,500	75,000	0.001	900	213.35	5,760	Их биеийн гэрэлтүүлэг
68	Гэрлийн 2 жилтэй хөнгөн цагаан кабель		м	200		1,800	-	0.001	900	213.35	-	Их биеийн гэрэлтүүлгэнд
69	Тоосго зүсэгч ир 400*32*3		ш	4	4	5,000	20,000	0.001	900	213.35	768	Засаар угсралт
70	Өрөм ф18 бабиттай		ш	4	4	5,000	20,000	0.001	900	213.35	768	Засаар угсралт, бетоны
71	Боолт гайк М=10	М10	ш	160	160	500	80,000	0.001	900	213.35	30,722	Үнс баригчийн фланц
72	Шланка ф=16		м	20	20	5,000	100,000	0.001	900	213.35	3,840	Үнс баригчид
73	Хомут ф18мм		ш	80	80	2,500	200,000	0.001	900	213.35	15,361	Үнс баригчид
74	Насадка ф550мм	Ф550	ш	3	3	650,000	-	0.100	900	213.35	-	Горелко
75	Өвсөн шүүр		ш	10	10	10,000	-	0.001	900	213.35	-	цэвэрлэгэнд
76	Хар цаас		боод	4		65,000	-	0.010	900	213.35	-	Бетон цутгах
77	Брус б=50мм		м	160		2,000	-	0.001	900	213.35	-	Бетон цутгах
78	Хар фанерь б=10мм	10мм	ш	20	6	30,000	180,000	0.005	900	213.35	5,760	Бетон цутгах
79	Хадаас	100мм	кг	6	6	2,800	-	0.001	900	213.35	-	100мм
							429,936,300					29,543,620

Гүйцэтгэл хянасан: "ДДЦС" ТӨХК-ний
 ИА-ны Техник хяналтын инженер
 Н.Эрдэнэбат

Гүйцэтгэл гаргасан: "СММ" ХХК-ний
 Засварын инженер
 М.Амгалан
